OBRA AMAGGI · LIGHT STEEL FRAME

Caderno de montagem

Plaqueamento externo


Placas Glasroc X 12,5 mm
132 placas · 214,3 m²
4 fachadas · 2 etapas de montagem

Conteúdo

01 Capa
02 Resumo e planta-chave
03 Sequência e regras de montagem
04–11 Fachadas: elevação e lista de placas
12 Controle de montagem

MODELO · numeração provisória

Rev. 00 · MODELO · 01/11/2026

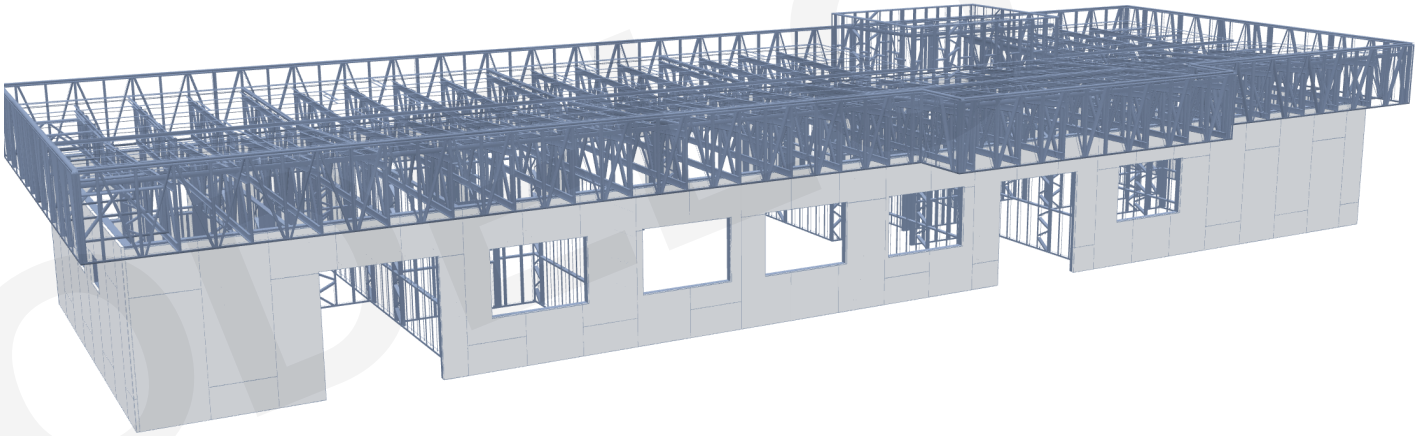

Vista 3D do modelo: estrutura de aço levantada e placas externas instaladas.

Resumo do plaqueamento


Código	Fachada	Placas	Área (m²)	Larg. 1,20 m	Cortadas	Vãos	Comprimento
FFRO	Fachada frontal	50	75,3	27	23	7	30,71 m
FLD	Fachada lateral direita	14	27,0	10	4	1	9,14 m
FFUN	Fachada fundos	51	82,9	20	31	13	30,77 m
FLE	Fachada lateral esquerda	17	29,1	9	8	2	9,19 m
Total		**132**	**214,3**	**66**	**66**	**23**	

Material e convenções

- Placa: Glasroc X 12,5 mm (placa de gesso com véu de fibra de vidro, para fechamento externo).
- Formato padrão: 1,20 m de largura; altura conforme a fiada (0,60 · 0,90 · 2,40 · 2,70 · 3,30 m).
- "Cortadas": placas com largura menor que 1,20 m ou com recorte em L/U em volta de janelas e portas.
- Código da placa: FACHADA-NN (ex.: FFRO-07). NN segue a ordem de montagem dentro da fachada.
- Etapa 1 = placas da base (apoiadas no piso). Etapa 2 = placas superiores, sobre a etapa 1.
- Juntas entre placas: 3 mm (modelo). Medidas em milímetros; áreas em m².

Planta-chave



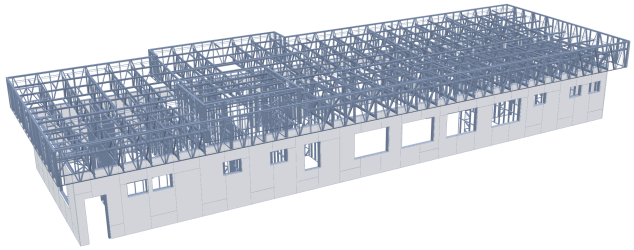

MODELO

1. **Conferir a estrutura**
   Painéis levantados, prumados e travados; contraventamento e vergas concluídos na fachada.

2. **Marcar a fachada**
   Separar as placas pelo código da fachada (FFRO, FLD, FFUN, FLE) e conferir as medidas da lista.

3. **Etapa 1 · base**
   Montar as placas apoiadas no piso, do canto esquerdo para o direito (vista de fora), na ordem 01, 02, 03...


4. **Etapa 2 · superiores**
   Montar as placas de cima sobre a etapa 1, da esquerda para a direita, mantendo as juntas desencontradas.

5. **Vãos de janelas e portas**
   Placas em L, U ou C contornando o vão; junta a no mínimo 40 cm dos cantos do vão.

6. **Fixação e juntas**
   Parafusos, espaçamentos, distância da borda e tratamento de juntas conforme o manual do fabricante.

7. **Registrar**
   Marcar cada placa montada no controle (folha 12) ou no app, com data e equipe.


Juntas amarradas (desencontradas)



Colunas alternadas: 2,40 + 0,90 m e 0,60 + 2,70 m.
A junta horizontal nunca se repete na coluna vizinha.

Etapa 1 · base Etapa 2 · superiores

Placas contornando o vão (junta a mín. 40 cm)

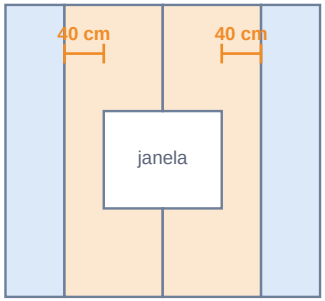


Placas em C abraçam o vão: a junta vertical fica a 40 cm da ombreira e a junta do meio cai no centro do vão, nunca no canto.

MODELO

Elevação com a numeração das placas


Número = ordem de montagem dentro da fachada. Medidas dos vãos em cm (largura × altura).

Etapa 1 · base Etapa 2 · superiores




Escala aprox. 1:61 · fachada destacada em laranja

Trecho 1 (esquerda)

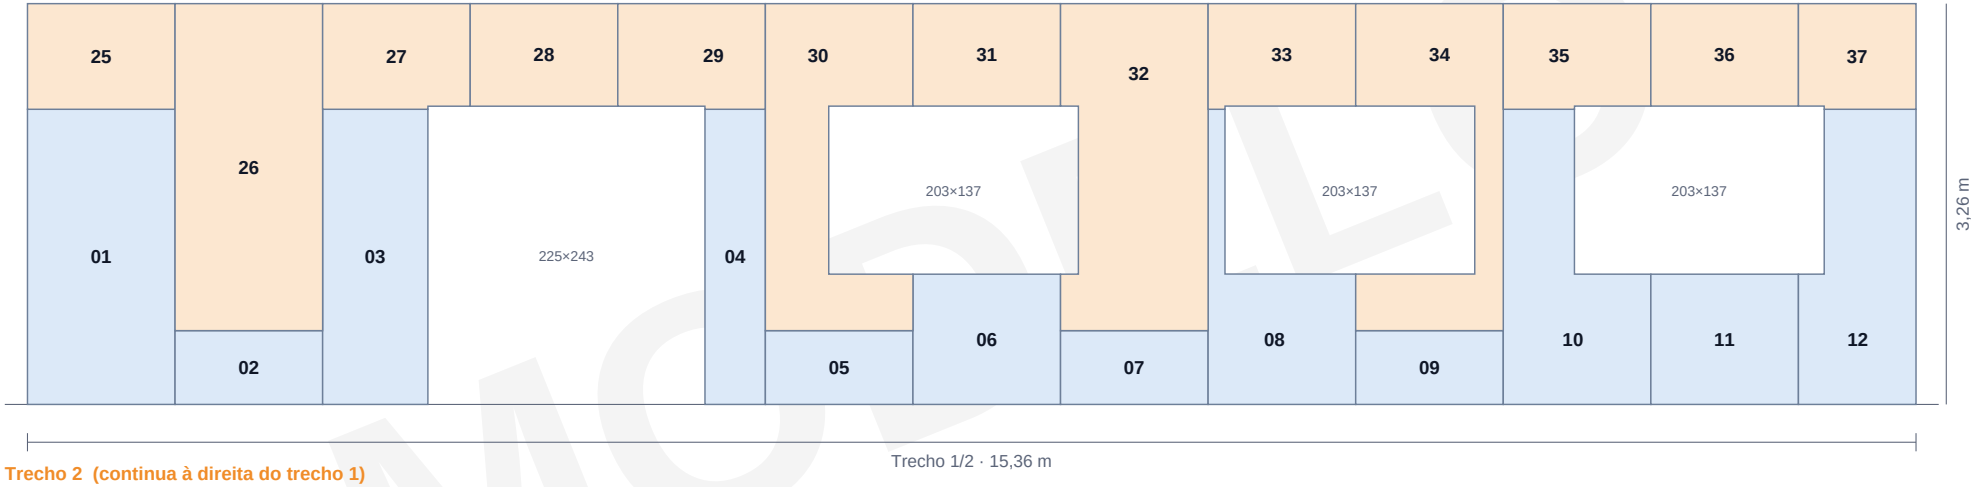

Trecho 1/2 · 15,36 m

Trecho 2 (continua à direita do trecho 1)

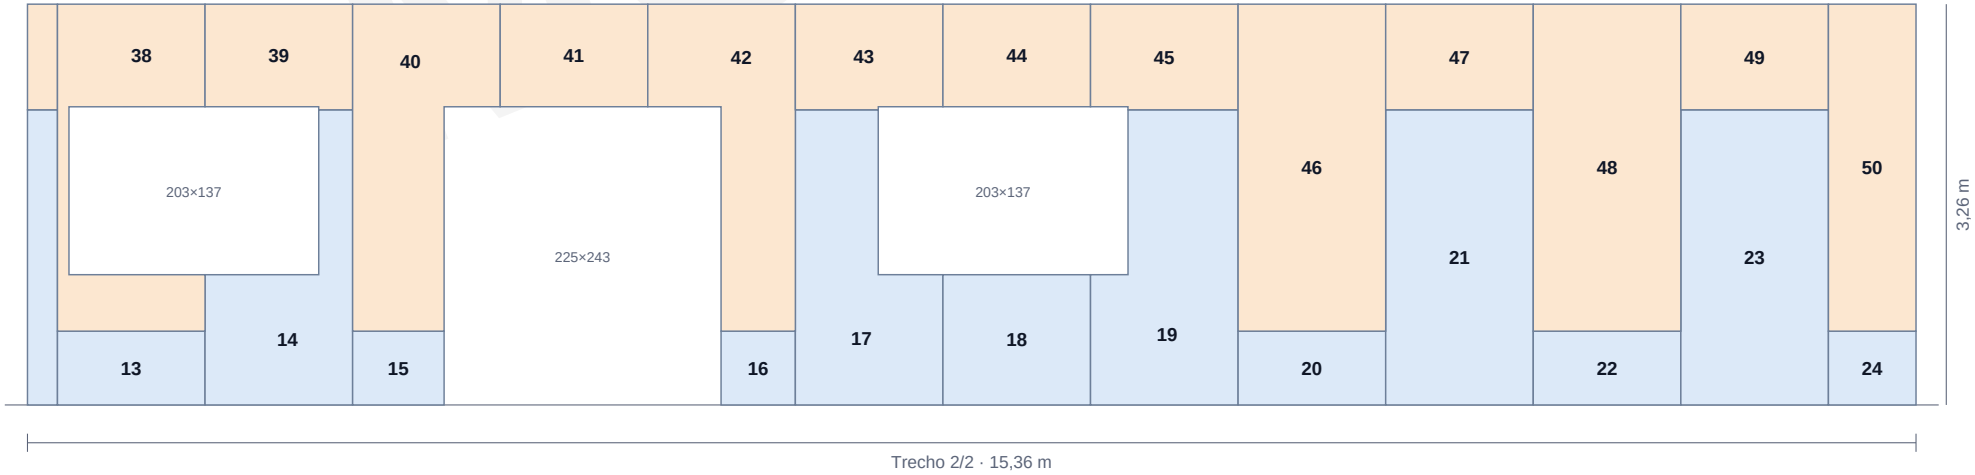

Trecho 2/2 · 15,36 m

FFRO · Lista de placas

50 placas · 75,3 m²


Código	Etapa	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Área (m²)	Formato
FFRO-01	1	1200	2400	2,88	inteira
FFRO-02	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-03	1	856	2400	2,05	cortada
FFRO-04	1	491	2400	1,18	cortada
FFRO-05	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-06	1	1200	1059	1,27	inteira
FFRO-07	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-08	1	1200	2400	1,46	recorte
FFRO-09	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-10	1	1200	2400	2,05	recorte
FFRO-11	1	1200	1059	1,27	inteira
FFRO-12	1	1200	2400	2,60	recorte
FFRO-13	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-14	1	1200	2400	1,64	recorte
FFRO-15	1	744	600	0,45	cortada
FFRO-16	1	604	600	0,36	cortada
FFRO-17	1	1200	2400	2,17	recorte
FFRO-18	1	1200	1059	1,27	inteira
FFRO-19	1	1200	2400	2,47	recorte
FFRO-20	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-21	1	1200	2400	2,88	inteira
FFRO-22	1	1200	600	0,72	inteira
FFRO-23	1	1200	2400	2,88	inteira
FFRO-24	1	712	600	0,43	cortada
FFRO-25	2	1200	859	1,03	inteira
FFRO-26	2	1200	2659	3,19	inteira
FFRO-27	2	1200	859	1,02	inteira
FFRO-28	2	1200	834	1,00	inteira
FFRO-29	2	1200	859	1,01	recorte
FFRO-30	2	1200	2659	2,25	recorte

Código	Etapa	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Área (m²)	Formato
FFRO-31	2	1200	833	1,00	inteira
FFRO-32	2	1200	2659	2,99	recorte
FFRO-33	2	1200	859	1,00	recorte
FFRO-34	2	1200	2659	1,87	recorte
FFRO-35	2	1200	859	1,01	recorte
FFRO-36	2	1200	833	1,00	inteira
FFRO-37	2	1200	859	1,02	inteira
FFRO-38	2	1200	2659	1,68	recorte
FFRO-39	2	1200	859	1,01	recorte
FFRO-40	2	1200	2659	2,36	recorte
FFRO-41	2	1200	834	1,00	inteira
FFRO-42	2	1200	2659	2,10	recorte
FFRO-43	2	1200	859	1,02	recorte
FFRO-44	2	1200	834	1,00	inteira
FFRO-45	2	1200	859	1,02	inteira
FFRO-46	2	1200	2659	3,19	inteira
FFRO-47	2	1200	859	1,03	inteira
FFRO-48	2	1200	2659	3,19	inteira
FFRO-49	2	1200	859	1,03	inteira
FFRO-50	2	712	2659	1,89	cortada


Elevação com a numeração das placas

Número = ordem de montagem dentro da fachada. Medidas dos vãos em cm (largura × altura).

Etapa 1 · base Etapa 2 · superiores



Escala aprox. 1:34 · fachada destacada em laranja

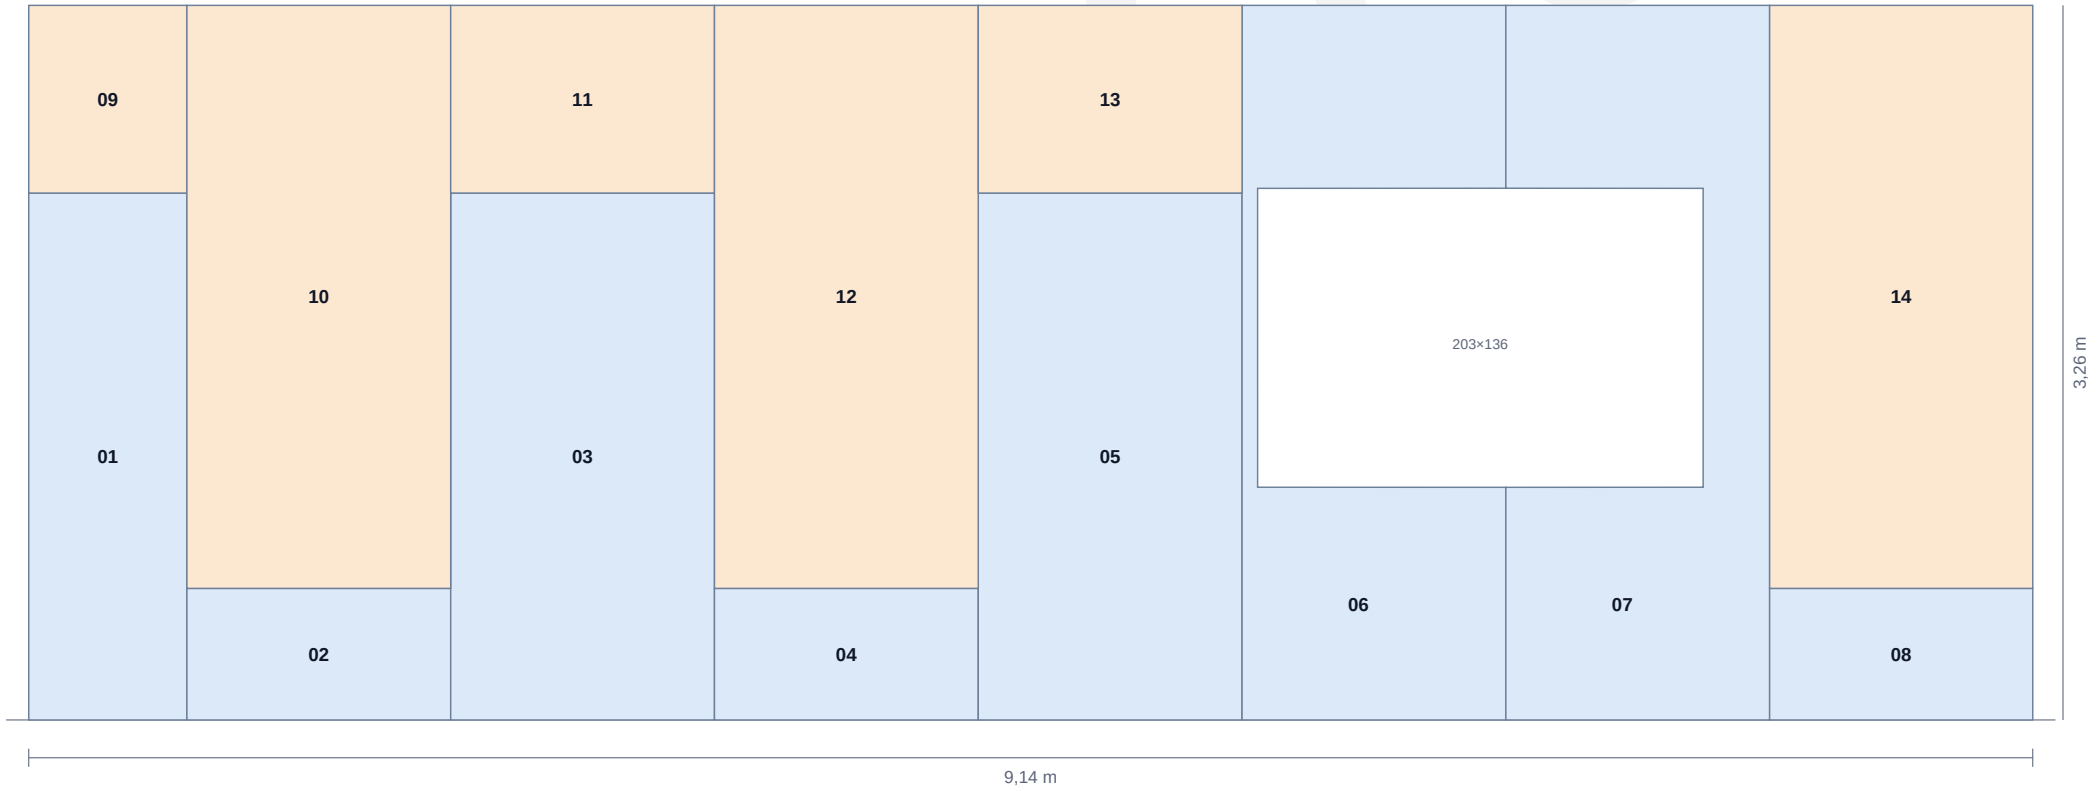

FLD · Lista de placas

14 placas · 27,0 m²


Código	Etapa	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Área (m²)	Formato
FLD-01	1	721	2403	1,73	cortada
FLD-02	1	1203	600	0,72	inteira
FLD-03	1	1203	2403	2,89	inteira
FLD-04	1	1203	600	0,72	inteira
FLD-05	1	1203	2403	2,89	inteira
FLD-06	1	1203	3259	2,38	recorte
FLD-07	1	1203	3259	2,69	recorte
FLD-08	1	1200	600	0,72	inteira
FLD-09	2	721	856	0,62	cortada
FLD-10	2	1203	2659	3,20	inteira
FLD-11	2	1203	856	1,03	inteira
FLD-12	2	1203	2659	3,20	inteira
FLD-13	2	1203	856	1,03	inteira
FLD-14	2	1200	2659	3,19	inteira

MODELO

Elevação com a numeração das placas


Número = ordem de montagem dentro da fachada. Medidas dos vãos em cm (largura × altura).

Etapa 1 · base Etapa 2 · superiores




Escala aprox. 1:62 · fachada destacada em laranja

Trecho 1 (esquerda)

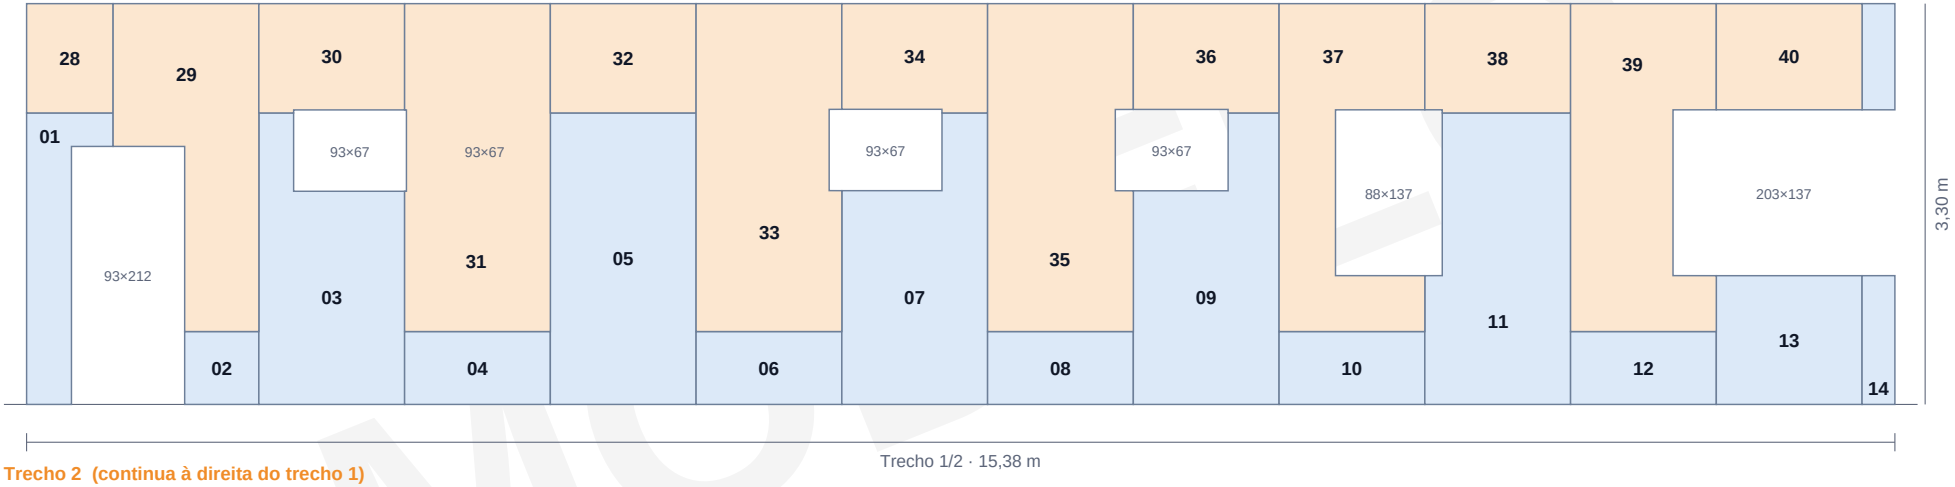

Trecho 1/2 · 15,38 m

Trecho 2 (continua à direita do trecho 1)

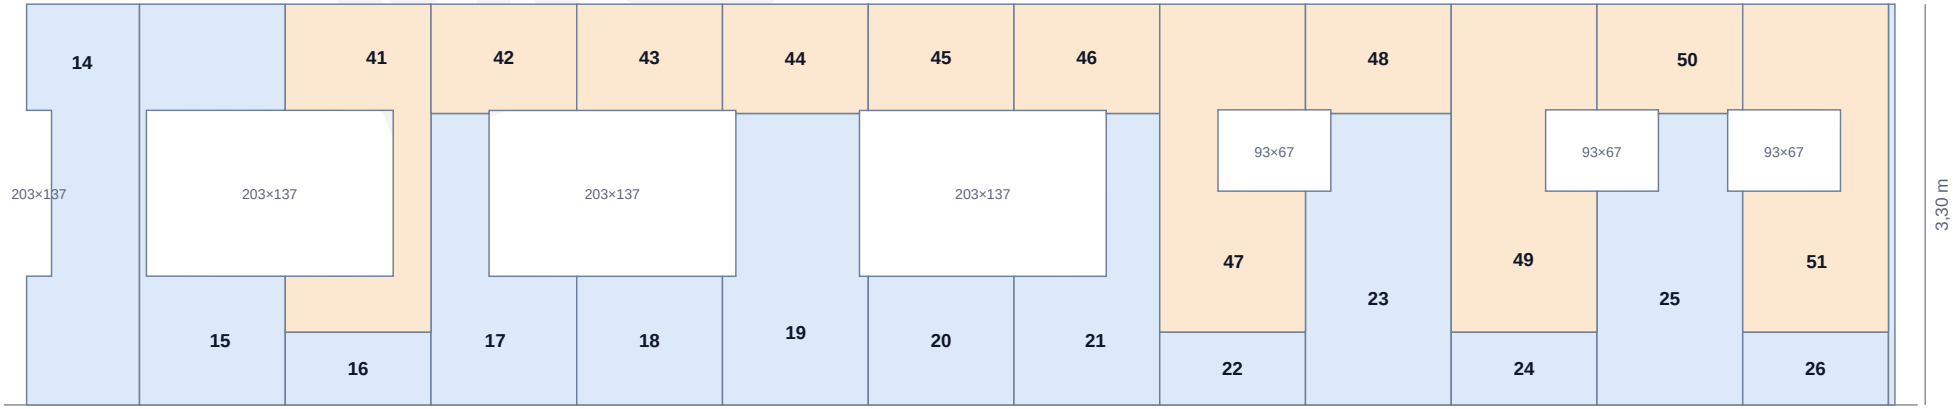

Trecho 2/2 · 15,38 m

FFUN · Lista de placas


51 placas · 82,9 m²

Código	Etapa	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Área (m²)	Formato
FFUN-01	1	712	2400	0,98	recorte
FFUN-02	1	611	600	0,37	cortada
FFUN-03	1	1200	2400	2,29	recorte
FFUN-04	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-05	1	1200	2400	2,88	inteira
FFUN-06	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-07	1	1200	2400	2,35	recorte
FFUN-08	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-09	1	1200	2400	2,38	recorte
FFUN-10	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-11	1	1200	2400	2,69	recorte
FFUN-12	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-13	1	1200	1060	1,27	inteira
FFUN-14	1	1200	3300	3,31	recorte
FFUN-15	1	1200	3300	2,40	recorte
FFUN-16	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-17	1	1200	2400	1,91	recorte
FFUN-18	1	1200	1059	1,27	inteira
FFUN-19	1	1200	2400	2,64	recorte
FFUN-20	1	1200	1059	1,27	inteira
FFUN-21	1	1200	2400	1,86	recorte
FFUN-22	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-23	1	1200	2400	2,75	recorte
FFUN-24	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-25	1	1200	2400	2,48	recorte
FFUN-26	1	1200	600	0,72	inteira
FFUN-27	1	53	3300	0,17	cortada
FFUN-28	2	712	900	0,64	cortada
FFUN-29	2	1200	2700	2,34	recorte
FFUN-30	2	1200	900	1,06	recorte
FFUN-31	2	1200	2700	2,61	recorte
FFUN-32	2	1200	900	1,08	inteira
FFUN-33	2	1200	2700	3,17	recorte
FFUN-34	2	1200	900	1,05	recorte
FFUN-35	2	1200	2700	3,14	recorte
FFUN-36	2	1200	900	1,06	recorte
FFUN-37	2	1200	2700	2,23	recorte
FFUN-38	2	1200	900	1,08	inteira
FFUN-39	2	1200	2700	2,75	recorte
FFUN-40	2	1200	874	1,05	inteira
FFUN-41	2	1200	2700	2,03	recorte
FFUN-42	2	1200	900	1,06	recorte
FFUN-43	2	1200	875	1,05	inteira
FFUN-44	2	1200	900	1,07	inteira
FFUN-45	2	1200	875	1,05	inteira
FFUN-46	2	1200	900	1,06	recorte
FFUN-47	2	1200	2700	2,76	recorte
FFUN-48	2	1200	900	1,07	inteira
FFUN-49	2	1200	2700	2,96	recorte
FFUN-50	2	1200	900	1,06	recorte
FFUN-51	2	1200	2700	2,70	recorte

Elevação com a numeração das placas

Número = ordem de montagem dentro da fachada. Medidas dos vãos em cm (largura × altura).

Etapa 1 · base Etapa 2 · superiores



Escala aprox. 1:35 · fachada destacada em laranja



FLE · Lista de placas

17 placas · 29,1 m²

Código	Etapa	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Área (m²)	Formato
FLE-01	1	1200	2403	2,88	inteira
FLE-02	1	1203	603	0,72	inteira
FLE-03	1	1203	2403	2,88	recorte
FLE-04	1	1203	603	0,72	inteira
FLE-05	1	1203	2403	2,44	recorte
FLE-06	1	1203	603	0,72	inteira
FLE-07	1	1203	2403	2,89	inteira
FLE-08	1	771	603	0,47	cortada
FLE-09	1	50	3259	0,01	cortada
FLE-10	2	1200	897	1,08	inteira
FLE-11	2	1203	2697	3,24	inteira
FLE-12	2	1203	897	1,08	inteira
FLE-13	2	1203	2697	2,64	recorte
FLE-14	2	1203	897	1,06	recorte
FLE-15	2	1203	2697	3,09	recorte
FLE-16	2	1203	897	1,08	inteira
FLE-17	2	771	2697	2,08	cortada

MODELO

Controle de montagem

Preencher na obra ou marcar no app

Fachada	Etapa	Placas	Qtd.	Área (m²)	Início	Fim	Equipe	Conferido por
FFRO	Etapa 1	01 a 24	24	34,3				
FFRO	Etapa 2	25 a 50	26	40,9				
FLD	Etapa 1	01 a 08	8	14,7				
FLD	Etapa 2	09 a 14	6	12,3				
FFUN	Etapa 1	01 a 27	27	41,7				
FFUN	Etapa 2	28 a 51	24	41,1				
FLE	Etapa 1	01 a 09	9	13,7				
FLE	Etapa 2	10 a 17	8	15,4				

MODELO

Observações
